



SERVIÇOS DW/BI

- ADRC-ST:** finalizado desenvolvimento de relatórios após retorno do ciclo 2, aguarda homologação pela IGF.
- Anexos RICMS:** realizada a reunião de kickoff e iniciado o plano de projeto.
- Ciência de Dados:** evoluído o modelo de enquadramento tributário (modelo especialista com boa acurácia e modelo geral com baixa precisão); finalizada a homologação e produção do modelo de predição do CEST.
- Benefícios Fiscais:** não iniciada a homologação do sistema de cadastro de benefícios; finalizados os ajustes pré instalação; realizada a carga histórica dos dados.
- BI Noteiras:** aguarda homologação da IGF para publicação.
- BI Gestão de Processos*:** finalizada versão beta, aguarda homologação pela 3ª e 8ª DRRs.
* Nome definitivo, o provisório era 'BI Controle de Demandas'.
- BI SISCREd:** não revisada a modelagem dimensional e não iniciado o mapeamento da camada semântica.

- BP-e:** está em andamento o desenvolvimento do relacional; a homologação não foi iniciada.
- DEIM:** foram implantados o relacional e o dimensional; não foi iniciada a construção da camada semântica.
- DIMP:** foi homologada a adequação do cartão de crédito; foi paralisada a modelagem e desenvolvimento do leiaute 6; dimensional finalizado, camada semântica iniciada.
- E-PAF:** foram iniciados o levantamento dos dados, a definição de escopo e a carga em stage.
- Indicadores Fiscais:** foi paralisada a especificação do novo indicador pela AGAA; não foi iniciada a especificação do serviço do ReceitaPR.
- MDF-e:** finalizada a carga histórica; implantado o relacional; em andamento a modelagem do dimensional; não foi iniciada a camada semântica.
- ONE:** finalizado o levantamento de escopo e definida a arquitetura técnica para carga dos dados.

SUSTENTAÇÃO


- Correção endereços DF:** reprocessamento em andamento.
- Eventos NF-e:** em andamento o mapeamento da camada semântica; a carga histórica dos dados anteriores a junho/2020 ainda aguarda correções pela Celepar.
- Preço Sugerido:** não iniciada a carga do relacional dos dados da Anvisa; iniciada carga dos dados de Sorvetes.
- EFD 2020:** em andamento a homologação do relacional.
- Arquitetura:** iniciados os testes de compatibilidade da versão MicroStrategy 2021.
- Treinamento:** realizada turma 2 nível 2 (15 auditores).

IMPACTOS NO PROJETO

Ponto de Atenção Risco

- Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- O controle de histórico do IPVA não foi solucionado a contento, qualidade da carga comprometida, optado por aguardar a implantação dos dados IPVA do sistema SGT.

EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)

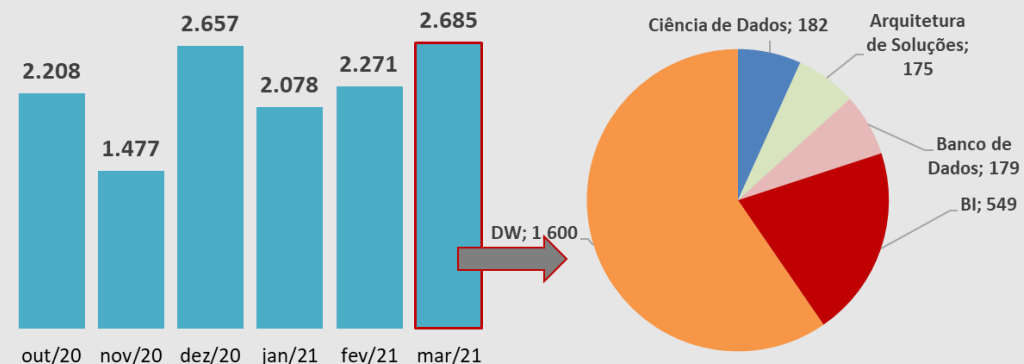



Atividades previstas para o próximo período

DATA WAREHOUSE

CIÊNCIA DE DADOS	- reavaliação do modelo geral de enquadramento tributário
BENEFÍCIOS FISCAIS	- iniciar homologação do sistema de cadastro de benefícios
BP-E	- finalizar desenvolvimento do relacional e iniciar homologação
ANEXOS RICMS	- finalizar e aprovar plano de projeto
DIMP	- implantar adequação (migração) da carga de cartões de crédito - iniciar modelagem e desenvolvimento relacional leiaute 6
EFD 2020	- finalizar homologação relacional e iniciar implantação
E-PAF	- finalizar levantamento dos dados, definir escopo fase 1 - implantar carga parcial em stage
EVENTOS NF-E	- finalizar carga histórica anterior a junho/2020, após correções Celepar
INDICADORES FISCAIS	- retomar especificação dos novos Indicadores Fiscais (IGF) - iniciar especificação do serviço do ReceitaPR
MDF-E	- finalizar dimensional
ONE	- iniciar carga dos dados em stage
PREÇO SUGERIDO	- finalizar carga dos dados da Anvisa no relacional - finalizar carga dos dados de Sorvetes na stage
SUSTENTAÇÃO	- continuar reprocessamento dos dados de endereço de Doc. Fiscal

BUSINESS INTELLIGENCE

BI ADRC-ST	- aguardar homologação pela IGF e planejar publicação
BI NOTEIRAS	- aguardar homologação pela IGF e planejar publicação
BI GESTÃO DE PROCESSOS	- aguardar homologação pelas DRRs e planejar publicação
CAMADA SEMÂNTICA	- finalizar mapeamento dos dados de NF-e eventos - continuar mapeamento dos dados do DEIM - finalizar mapeamento dos dados do DIMP - iniciar mapeamento dos dados do MDFe
TREINAMENTO	- realizar turma 3 nível 2 dos treinamentos (EAD) 2021 do BI
ARQUITETURA	- finalizar testes de compatibilidade da versão MicroStrategy 2021 - iniciar testes do Platform Analytics e do Enterprise Manager na versão do MicroStrategy 2021



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy ■ Descontinuado

BDF SINTEGRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
-----------------	-------------------	------	-----	-------	-------------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	--------------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FAS 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS ATACADO (FASE 5) NFAE, NFP	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 3) BPE	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) MDFE
APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD	APURAÇÃO (FASE 2) EFD	CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO RFB (FASE 1) RFB	CADASTRO RFB (FASE 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, DTA	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) EFD	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 3) DEIM
CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	CRÉDITOS (FASE 1) SISCREG	EVENTOS (FASE 1) NFE	EVENTOS (FASE 2) NFE	GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1) IVA	IPVA (FASE 2) IVA	IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	IPVA (SGT) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1) CC, EFD	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 2) CC
MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 3) DIMP	PREÇO SUGERIDO (FASE 1) TPS	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1) RH	SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DEFIS, DESTDA	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST	VÍNCULOS TROVALLE		

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/migrados/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf

Paralisado

NÃO INICIADO

ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 3) UPD, ADF, ECF	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	BOLSA Bolsa Família	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	CADASTRO (OUTROS) DT-E, RECEITA/PR	CRÉDITOS (FASE 2) SISCREG, BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI	FINANCEIRO SIAF
COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3E, NFe COM	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 4) NPR	PREÇO SUGERIDO (FASE 2) TPS	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 2) QUO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 4) CTE	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO ONE, DER	TRATAMENTO DIFERENCIADO TTD			

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

