



IMPLANTAÇÕES DW

IPVA:

- Fase 1 (lançamentos), fase 2 (parcelamentos) e fase 3 (débitos): relacional não implantado
- Fase 3 (veículos): relacional finalizado, em fase de homologação

Simples Nacional:

- AINF, COMPSN, PARCSN: stages em andamento
- DEFIS: relacional não iniciado
- DASD (novo leiaute): pré-stage finalizada
- DASD: relacional implantado

MANUTENÇÕES DW

- Cadastro:** update de Pessoas nas tabelas de documentos fiscais e itens finalizado
- Marcas:** implantado em produção as marcas cadastro de CT-e OS e BP-e
- Documentos Fiscais:** em andamento a evolução da malha de carga de cupom fiscal/itens informados em EFD
- Tabelas de Referência:** fase 1 implantada; fase 2 e fase 3 em andamento
- Ambiente:** banco de dados migrado para v. 16.10

INICIATIVAS BI


- Realizado mentoring MicroStrategy para **16 auditores** (1ª DRR)
- A **integração das camadas semânticas** está pronta para entrar em produção, mas ainda aguarda a revisão de pastas e nomenclaturas (a outra dependência, a conclusão de atualizações cadastrais no DW, foi concluída)
(unificação Projetos MicroStrategy "DW Corporativo" e "RAF-DW")

IMPACTOS NO PROJETO



- Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades
- DW IPVA: Convênio com Detran para acesso a dados do DCV ainda pendente mas em fase final
- Carga histórica dos cupons fiscais informados em EFD paralisada (malha de carga sendo ajustada)
- Monitoramento dos servidores e aplicações de ETL/BI pela Celepar ainda necessita ajustes
- Problemas na implantação do Cadastro novas origens gerou atraso no início de outras atividades, inclusive na implantação do novo projeto unificado MicroStrategy

EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)

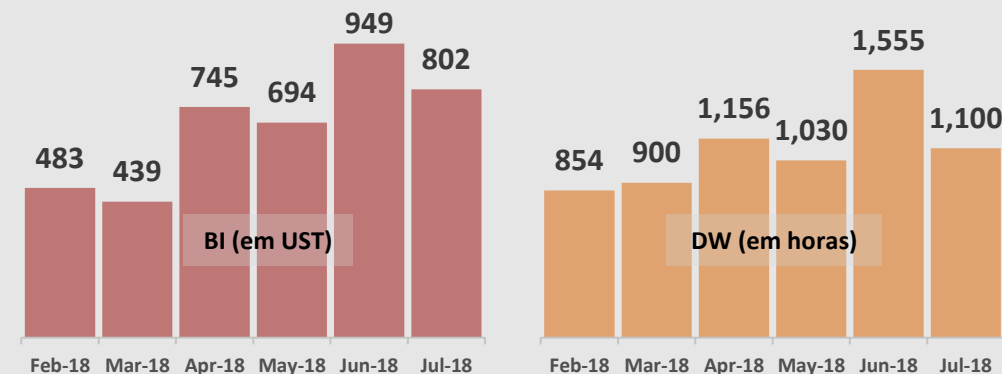



Atividades previstas para o próximo período

DATA WAREHOUSE

BUSINESS INTELLIGENCE

IPVA

implantar o relacional fase 1 (lançamentos), fase 2 (parcelamentos) e fase 3 (débitos e veículos)
 iniciar o relacional fase 4 (demais dados IVA)

INTEGRAÇÃO PROJETOS

finalizar revisão de pastas e nomenclaturas
 realizar implantação do novo projeto

SIMPLES NACIONAL

desenvolvimento das stages AINF, COMPSN e PARCSN
 iniciar desenvolvimento do relacional DEFIS
 finalizar desenvolvimento do relacional DASD (novo layout)

RAF

apoio técnico presencial de um consultor na IGF (parcial)

DOCUMENTOS FISCAIS

continuar evolução dos processos de carga de cupom fiscal/itens informados em EFD

MENTORING

para auditores da 1ª DRR

TABELAS DE REFERÊNCIA

finalizar o projeto das tabelas de domínio



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

Disponível via acesso direto Disponível via acesso direto E via MicroStrategy Descontinuado

BDF SÍNTegra	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
--------------	----------------	------	-----	-------	-------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

Paralisado

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASES 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	
APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD	APURAÇÃO FASE 2 EFD	CADASTRO CIF	CAIXA DIÁRIO MTAB	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 1) CC, EFD	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 2) CC	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF	GIA GIA, GIA ST
IPVA (FASE 1) IVA	IPVA (FASE 2) IVA	IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAS-D	SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DEFIS, DESTDA	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF	

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf

NÃO INICIADO

* Outras origens: Cadin, Nota Paraná, e-Protocolo, Regime Especial, Scanc, Dvec, Preço Sugerido

APOIO DOCUMENTOS FISCAIS FASE 2 UPD, ADF, ECF, CTRPRO, NFCEPRO	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, EFD	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) DEIM, DTA	COMPLEMENTO CADASTRO (RFB) RFB	COMPLEMENTO CADASTRO (NFP) NFP	CRÉDITOS SISCRE, BCR	ECONÔMICO DFC, GI	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL ECD	FINANCEIRO SIAF, REG	ITCMD ITCMD	MERCADORIAS ATACADO FASE 5 NFAE, NFP	RECURSOS HUMANOS RH, QUO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FASE 3 CTE
---	---------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------------------	-------------------------	----------------	---	-----------------------------	--------------------------------------

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

