



## IMPLANTAÇÕES DW



**Ciência de Dados:** em andamento as etapas de preparação dos dados e modelagem do RACE para novo algoritmo de dívida ativa



### ADRC-ST:

- implantação da carga pré-stage não realizada
- desenvolvimento stage e relacional finalizado
- relacional em fase de homologação



**Preço Sugerido:** desenvolvimento da carga stage e relacional finalizado, em fase de homologação



**Recursos Humanos:** homologação e implantação não realizada



**GRPR/GNRE:** carga na sandbox do espelho das guias de recolhimento (GRPR) para IGA/SCA, carga de GNRE não iniciada

## MANUTENÇÕES DW / BI



**Otimização:** estudos e testes para melhorias e otimizações na malha de carga Teradata paralisados



**Migrações BI:** descontinuação do FDW (Sandbox) finalizada



### Sustentação:

- arquitetura de carga de arquivos XML e controle validados



- gravação de vídeos tutoriais BI em andamento



- carga adaptada para novo layout 1.3.0 do DEFIS



- malha fiscal do Simples Nacional adaptada para contemplar novas regras de negócio



- carga dos dados SUFRAMA dos anos de 2018 parte 2 (abril a dezembro) e 2019 realizada

## INICIATIVAS BI



**Mentoria:** realizado mentoring MicroStrategy para **11** auditores (1ª DRR)



### Treinamento:

- Realizada turma 1 para **15** auditores na EFAZ e turma 2 para **10** auditores na 8ª DRR
- Turmas 3 e 4 suspensas



**BI Adm Teradata:** finalizado desenvolvimento dos painéis de automatização do relatório mensal DBA



**BI ECD:** realizadas correções na carga dos dados, iniciada evolução corretiva nos relatórios e painéis



**BI Benefícios Fiscais:** desenvolvimento protótipo (via cubos BI) finalizado e validado pelo Gabinete



**BI SPF:** entendimento realizado e escopo definido



**BI SIAF:** entendimento e definição do escopo não iniciado

## IMPACTOS NO PROJETO




Ponto de Atenção



Risco

- ▶ Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades
- ▶ O controle de histórico do IPVA não foi solucionado a contento, qualidade da carga comprometida
- ▶ Desenvolvimento do aplicativo Classificador de Itens **foi paralisado** (será necessária novo recurso humano para dar continuidade ao desenvolvimento)
- ▶ Treinamentos **suspensos** pela EFAZ devido a pandemia.

## EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)

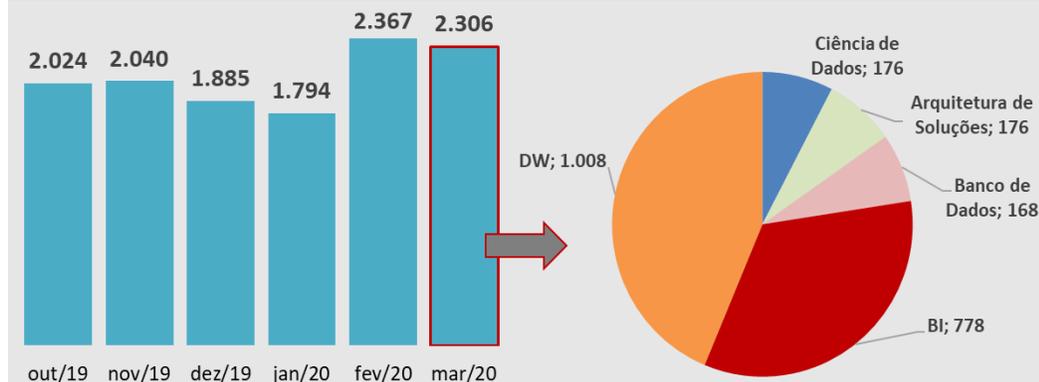



## Atividades previstas para o próximo período

### DATA WAREHOUSE

<b>CIÊNCIA DE DADOS</b>	- finalizar a preparação dos dados e a modelagem do RACE para novo algoritmo de dívida ativa e iniciar a fase de análise dos resultados
<b>ADRC-ST</b>	- implantar a carga em pré-stage - finalizar homologação do relacional e realizar a implantação
<b>OTIMIZAÇÃO</b>	- concluir os estudos de melhorias na malha de carga do Teradata
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	- finalizar homologação e realizar implantação da Fase 1
<b>DIMP</b>	- iniciar desenvolvimento da carga em pré-stage
<b>E-PROTOCOLO</b>	- iniciar desenvolvimento da carga no relacional
<b>SUSTENTAÇÃO</b>	- reprocessar os dados de endereço de Documento Fiscal - reprocessar os dados de eventos de CT-e - redesenhar a carga stage NF-e ('loop')
<b>PREÇO SUGERIDO</b>	- finalizar homologação e implantação em produção
<b>MVA</b>	- finalizar ajustes para carga da tabela de referência
<b>Novo SIAF</b>	- iniciar entendimento e definição do escopo para carga em Sandbox

### BUSINESS INTELLIGENCE

<b>BI BENEFÍCIOS FISCAIS</b>	- iniciar levantamento e desenho da solução definitiva
<b>BI ECD</b>	- implantar e divulgar nova versão (evolutiva) BI ECD
<b>BI SPF</b>	- iniciar desenvolvimento do dossier
<b>TREINAMENTO</b>	- finalizar gravação de vídeos tutoriais



## Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

### SANDBOX

■ Disponível via acesso direto   ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy   ■ Descontinuado

BDF SÍNTETRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
--------------	----------------	------	-----	-------	-------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----------------	----	--------

### DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASES 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS ATACADO (FASE 5) NF Avulsa, NFP	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD
APURAÇÃO FASE 2 EFD	CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO RFB (FASE 1) RFB	CADASTRO RFB (FASE 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, DTA	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1) IVA	IPVA (FASE 2) IVA
IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	IPVA (SGT) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1) CC, EFD	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 2) CC	PREÇO SUGERIDO TPS	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1) RH	SIMPLES NACIONAL (FASE 1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE 2) DEFIS	SIMPLES NACIONAL (FASE 2) DESTDA
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST											

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: [http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas\\_Assunto\\_DW\\_SEFACRE.pdf](http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf)

Paralisado

### NÃO INICIADO

ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 3) UPD, ADF, ECF	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	BOLSA Bolsa Família	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) DEIM, EFD	CRÉDITOS SISCREG, BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI	FINANCEIRO SIAP, REG
COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3E, NFe COM	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 3) BPE, NPR	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 3) DIMP	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 2) QUO	REGIMES ESPECIAIS REGIME ESPECIAL	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) CTE, MDFE	SIMPLES NACIONAL (FASE 3) COMPSN, PARCSN, AINF	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO ONE	VÍNCULOS TROVALE	

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

