



## SERVIÇOS DW/BI

- ADRC-ST:** a IGF finalizou os requisitos e escopo dos relatórios/cruzamentos. A preparação da semântica está em andamento. Foi iniciada a modelagem relacional no DW para a fase 2 (centro de distribuição).
- Ciência de Dados:** os resultados do algoritmo da dívida ativa estão em homologação pela IGA e já foi iniciada uma evolução do algoritmo.
- DIMP:** a carga pré-stage está sendo adaptada para possibilitar carga individualizada dos arquivos; a carga stage está em homologação; a modelagem do relacional foi iniciada.
- Benefícios Fiscais:** finalizada a modelagem de dados do DW e definidos os protótipos das telas.
- BI ECD:** produto implantado e divulgado.

- BI DF-e:** o desenvolvimento de um protótipo foi finalizado, será disponibilizado para testes da IGF.
- BI Noteiras:** foi definido o escopo (27 relatórios); o desenvolvimento está em 57% e a IGF iniciou a homologação dos relatórios já entregues.
- BI SPF:** aguarda homologação (IGF).
- EFD (Exportação):** construção da semântica está em andamento.
- E-Protocolo:** a carga stage está sendo ajustada para protocolos sigilosos não originados na SEFA.
- Treinamento:** concluídos os vídeos tutoriais BI, em andamento a preparação da publicação; realizada a preparação do treinamento online.

## SUSTENTAÇÃO


- RH:** a finalização da semântica aguarda trabalhos de ajustes no DW.
- TPS:** a finalização da semântica aguarda trabalhos de ajustes no DW.
- Monitoramento BI:** foi iniciada a migração do Enterprise Manager para Platform Analytics (17%).
- Correção endereços DF:** foi homologada a correção da carga, ainda pendente implantar e reprocessar.
- Correção eventos CT-e:** foi implantada a correção da carga, ainda pendente reprocessar.

## IMPACTOS NO PROJETO

Ponto de Atenção Risco

- Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- O controle de histórico do IPVA não foi solucionado a contento, qualidade da carga comprometida.
- Desenvolvimento do aplicativo Classificador de Itens foi **paralisado** (será necessária novo recurso humano para dar continuidade ao desenvolvimento).
- Os trabalhos de definição de escopo para o BI Novo SIAF **não foram iniciados**, aguardando manifestação da área demandante.
- A Celepar ainda não solucionou o problema no acesso à **Biblioteca BI no ambiente externo**.

## EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)

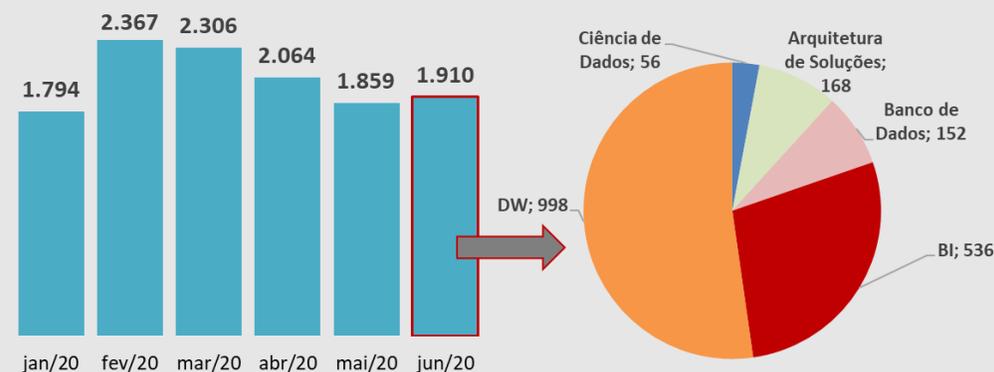



## Atividades previstas para o próximo período

### DATA WAREHOUSE

<b>CIÊNCIA DE DADOS</b>	- aguardar homologação do algoritmo classificador das dívidas pela IGA - continuar evolução do algoritmo com o aprendizado por reforço
<b>ADRC-ST</b>	- finalizar desenvolvimento relacional Fase 2 (centro de distribuição)
<b>BENEFÍCIOS FISCAIS</b>	- finalizar plano de projeto e cronograma
<b>CURADORIA</b>	- finalizar plano de projeto e cronograma - iniciar desenvolvimento
<b>DIMP</b>	- finalizar homologação da carga em pré-stage adaptada e da stage - iniciar desenvolvimento do relacional
<b>EFD</b>	- iniciar homologação da carga das stages versão 2020 - iniciar modelagem relacional e desenvolvimento para versão 2020
<b>E-PROTOCOLO</b>	- finalizar ajustes da carga stage de protocolos sigilosos não originados na SEFA
<b>SUSTENTAÇÃO</b>	- iniciar reprocessamento dos dados de endereço de Documento Fiscal - iniciar reprocessamento dos eventos CT-e

### BUSINESS INTELLIGENCE

<b>BI ADRC-ST</b>	- iniciar desenvolvimento dos relatórios/cruzamentos
<b>BI DF-E</b>	- iniciar homologação do dossier
<b>BI NOTEIRAS</b>	- finalizar desenvolvimento dos relatórios detalhados/consolidado - aguardar término da homologação pela IGF
<b>BI SPF</b>	- aguardar término da homologação pela IGF para publicação - aguardar definição quanto a perfil de acesso (IGF)
<b>ARQUITETURA</b>	- Aguardar solução dos problemas de instabilidade do ambiente MicroStrategy Biblioteca externa (Celepar)
<b>CAMADA SEMÂNTICA</b>	- finalizar mapeamento dos dados do ADRC-ST - finalizar mapeamento dos dados de Exportação (EFD) - revisar mapeamento do Preço Sugerido e RH, após ajustes DW - iniciar mapeamento dos dados de Benefícios Fiscais
<b>TREINAMENTO</b>	- divulgar vídeos tutoriais - realizar turma de treinamento online
<b>DOCUMENTAÇÃO</b>	- iniciar plano de projeto para documentar regras produtos BI



## Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

### SANDBOX

■ Disponível via acesso direto   ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy   ■ Descontinuado

BDF SÍNTETRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
--------------	----------------	------	-----	-------	-------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----------------	----	--------

### DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASES 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS ATACADO (FASE 5) NF Avulsa, NFP	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD
APURAÇÃO FASE 2 EFD	CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO RFB (FASE 1) RFB	CADASTRO RFB (FASE 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, DTA	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) EFD	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1) IVA
IPVA (FASE 2) IVA	IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	IPVA (SGT) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1) CC, EFD	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 2) CC	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 3) DIMP	PREÇO SUGERIDO TPS	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1) RH
SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DEFIS, DESTDA	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST									

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: [http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas\\_Assunto\\_DW\\_SEFACRE.pdf](http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf)

Paralisado ❌

### NÃO INICIADO

ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 3) UPD, ADF, ECF	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	BOLSA Bolsa Família	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	CADASTRO (OUTROS) DT-E, RECEITA/PR	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 3) DEIM	CRÉDITOS SISCREB, BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI
FINANCEIRO SIAF	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3E, NFe COM	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 3) BPE, NPR	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 2) QUO	REGIMES ESPECIAIS REGIME ESPECIAL	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) CTE, MDFE	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO ONE	VÍNCULOS TROVALE		

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

